

柏崎刈羽原子力発電所定期検査実績

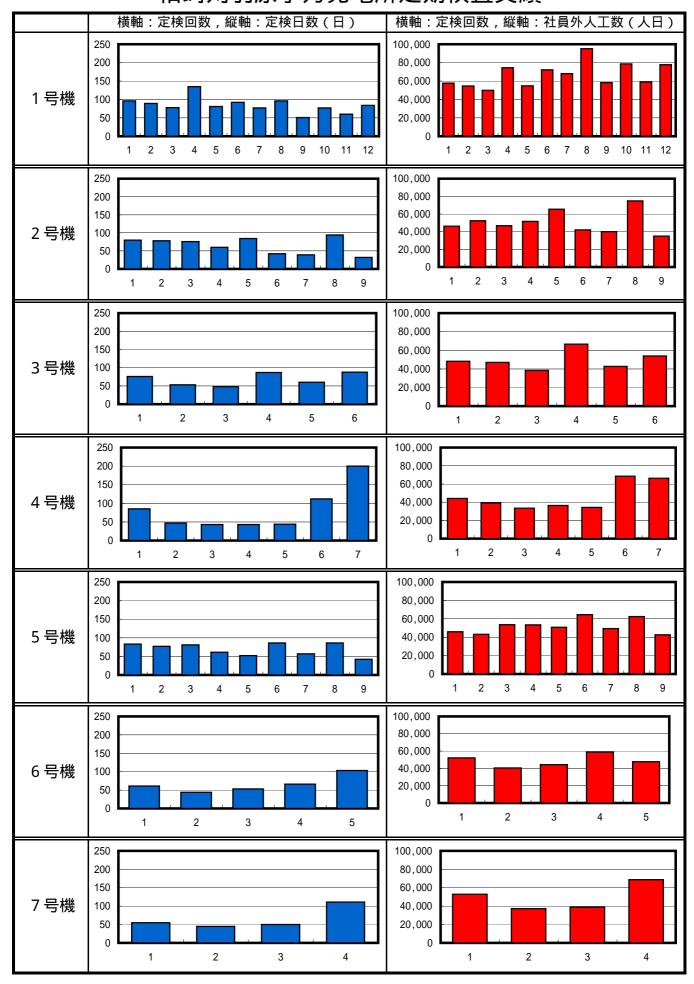

柏崎刈羽1号機定期検査の実績

定検回数	解列日	並入日	定検日数	社員外人工数 (人日)			空期検索内に空旋した土亜工事
				定検作業	改良工事分等	計	定期検査中に実施した主要工事
1	\$61.9.15	\$61.12.19	96	57,379	287	57,666	LPRM取替工事
2	\$63.1.30	\$63.4.27	89	54,476	164	54,640	LPRM取替工事
3	H元.4.15	H元.7.1	78	49,362	627	49,989	CUW系弁類点検、CUW系再生熱交換器点検、PLR系小口径配管修理工事
4	H2.8.26	H3.1.7	135	73,988	465	74,453	水没弁点検、新型制御棒の採用、蒸気タービン低圧内部車室水平継手面修理工事
5	H4.2.28	H4.5.18	81	54,475	390	54,865	CUW系熱交換器修理工事、新型制御棒の採用、蒸気タービン低圧内部車室水平継手面修理工事
6	H5.4.18	H5.7.18	92	70,422	1,838	72,260	シュラウドサポートプレートマンホール蓋修理工事、CUW系熱交換器修理工事
7	H6.9.18	H6.12.3	77	66,428	1,489	67,917	蒸気乾燥器ドレンチャンネル修理工事、ジェットポンプビーム点検工事
8	H8.1.26	H8.4.30	96	92,398	2,739	95,137	水没弁点検、D / W内小口径配管修理工事、蒸気乾燥器ドレンチャンネル修理工事
9	H9.6.28	H9.8.17	51	57,825	508	58,333	D / W内小口径配管修理工事
10	H10.10.6	H10.12.21	77	77,371	1,244	78,615	D / W内小口径配管修理工事
11	H12.2.17	H12.4.16	60	54,944	3,950	58,894	水素注入設備設置工事
12	H13.5.7	H13.7.29	84	75,683	1,976	77,659	アクシデントマネジメント対策工事

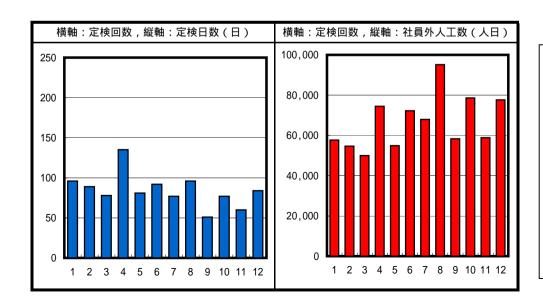

< 定期検査短縮のための方策: 平成7年以降実施>

時間単位による工程管理

・時間単位の詳細工程表の作成

予備品の入れ替え方式による点検

・制御棒駆動機構,海水ポンプ,電気式油圧制御設備等の一部部 品を予備品と交換

作業環境の改善及び作業効率の向上

・PHS基地局増設,作業用照明の増設,軽食自動販売機設置 管理区域内休憩所設置,管理区域内トイレの設置
