


柏崎刈羽原子力発電所 4号機原子炉再循環系配管点検結果

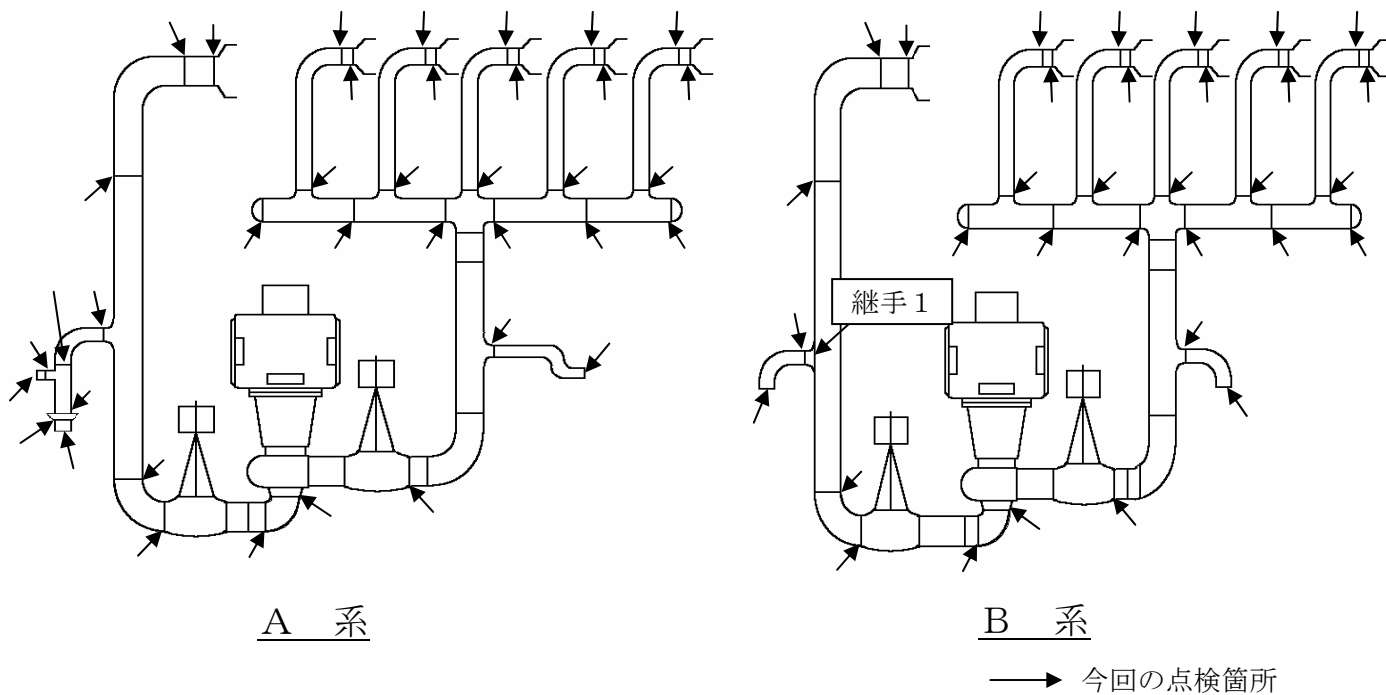

継手 1

単位：mm

番号	指示長さ	指示深さ	配管外径	配管肉厚	備考
①	約 53	約 5.2	609.6	30.9	上流
②	約 14	約 4.4			
③	約 15	約 3.0			
④	約 21	約 4.7			
⑤	約 12	約 4.6			
